

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 22/02/2025

Inspecteur: Wim Decock

Mentor:

Installateur: Ovaere Franky

ID-label: 5

B.T.W. nr.: BE 0678 253 296

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: MI 3102

Serienummer: 23162213

Datum verslag: 22/02/2025

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Kouterstraat
Huisnummer 5
Busnummer
Postcode 8550
Gemeente ZWEVEGEM
Land België

Eigenaar

Naam Beyaert
Straatnaam Kouterstraat
Huisnummer 5
Busnummer
Postcode 8550
Gemeente ZWEVEGEM
Land België

Installateur

Naam Ovaere Franky
BTW nr. BE 0678 253 296
Telefoonnummer +32 477 24 00 02
E-mail Franky.ovaere@telenet.be

Type : woning

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 541448860023973873

Teller Nr.: : 1LGZ0570480271



Aard onderzoek:

Is de installatie aangevat voor 01/06/2023?

Nee

Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1 - 6.4. en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 3N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 25 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 27



Aardelektrode: Aardingslus

Ri algemeen: 154.1 MΩ

RE: 9.58 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	27	-	-
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	8	-	-
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	8	-	-
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	6	-	-

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Zie schema	-	-		-	-
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

nota/note 12 De elektrische installatie staat niet onder spanning. De goede werking van de differentieelschakelaars kon niet getest worden.

nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.

nota/note 22 Keuken nog niet volledig geplaatst. Keukentoestellen en/of -meubels nog te voorzien.

nota/note 37 Toestellen niet geplaatst op moment van controle. Maximaal vermogen kon niet worden nagekeken ter bepaling van het gebruik van de kring (Boek 1 onderafdeling 5.2.1.2.)

nota/note 5 De verlichting is nog niet definitief geplaatst.

nota/note 9 Badkamer is nog niet volledig afgewerkt. Bad en/of douche dient nog geplaatst te worden.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 22/2/2050
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 5

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 09:31 tot 09:58
De inspecteur Wim Decock

Wim Decock
ACEG VZW - #388

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechte reeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 22/2/2050	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.











grondschemabeyaartkouterstraat5zwevegem

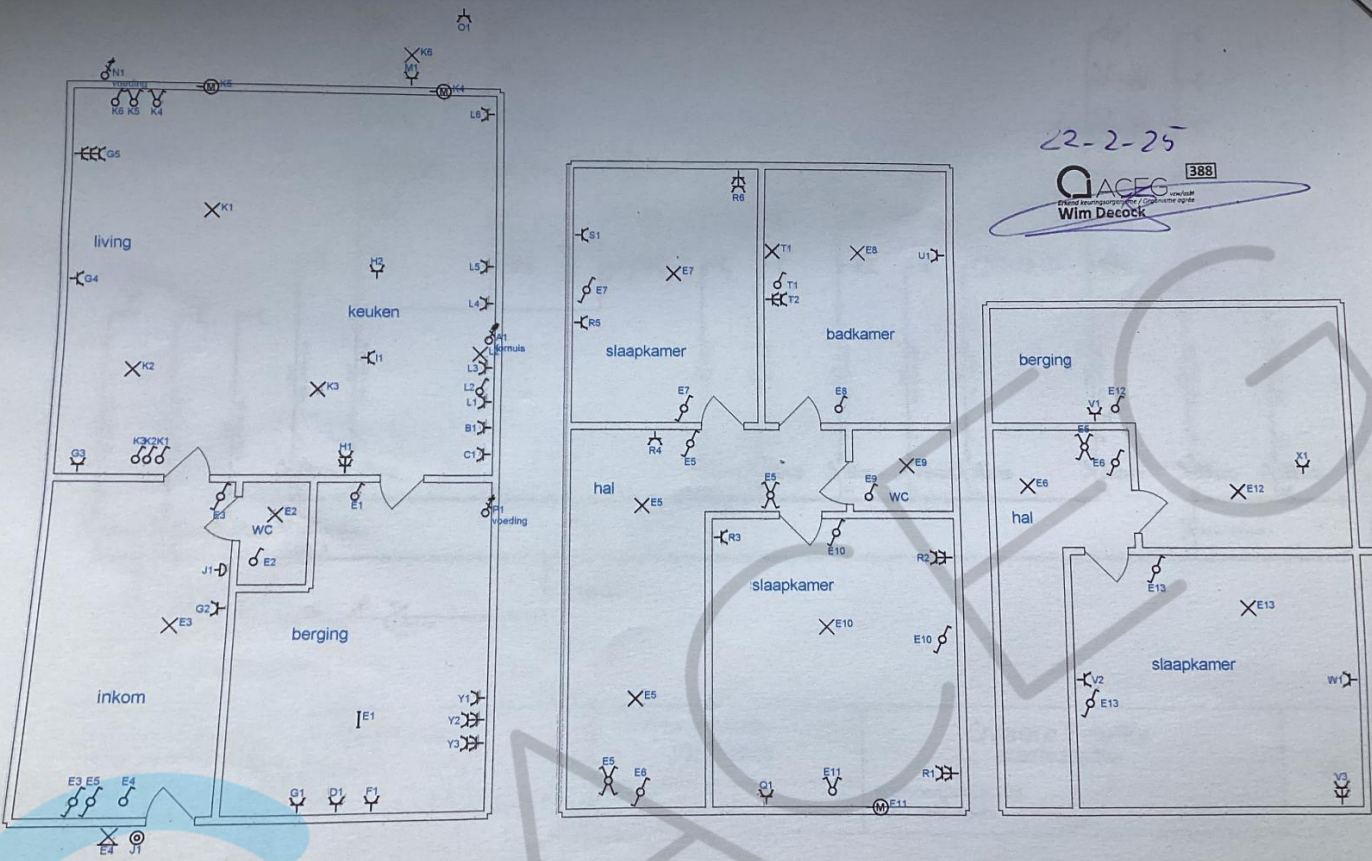


22-2-25

ACEG
Wim Decock

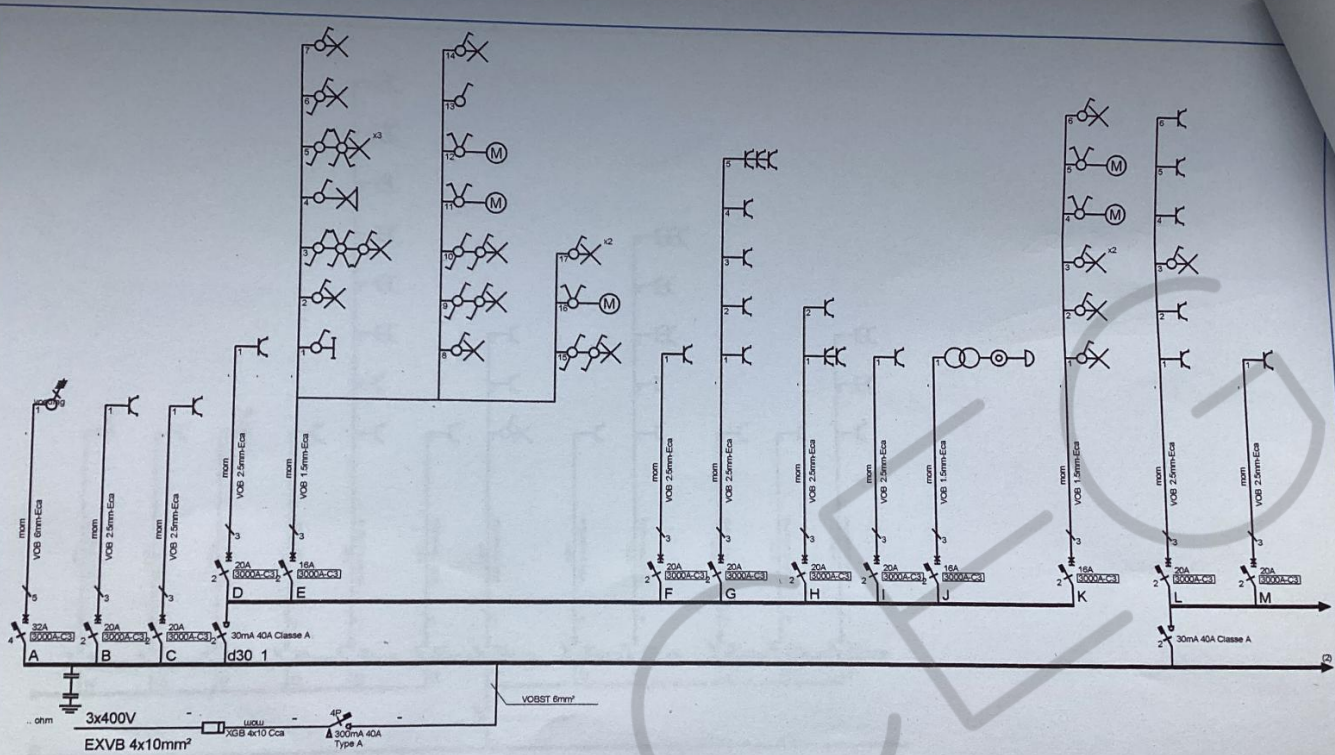

Afgev. erkend organisme 82/2/2025 388 Handtekening Wim Decker	Eigenaar Beyaert Kouterstraat 5 8550 Zwevegem EAN 541448860023973873	Verantw. uitvoering 20/02/2025 Handtekening	Ovaere Franky BE0678.253.296 Wulfsbergstraat 13a 8550 Zwevegem	1/2
---	---	--	--	------------

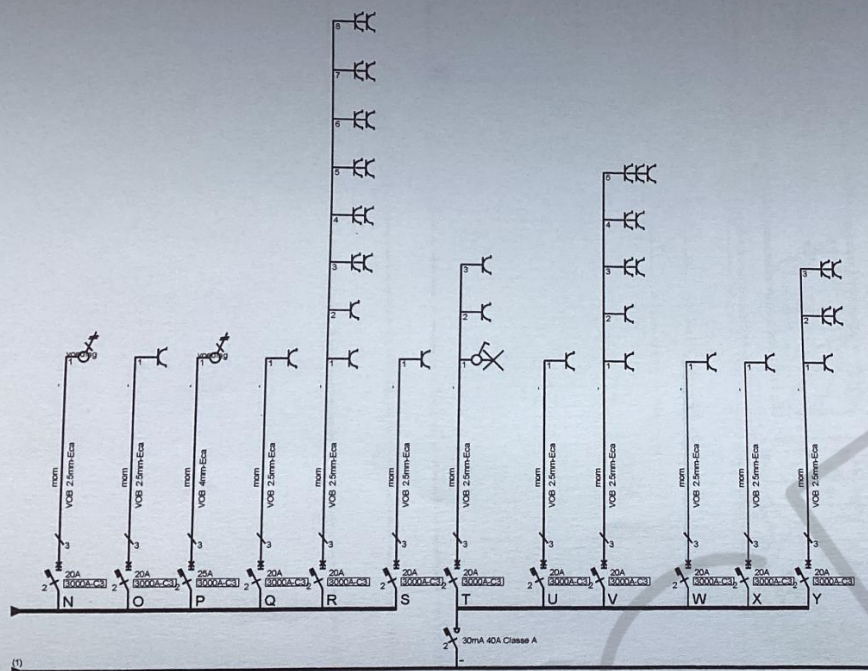

Afgev. erkend organisme 23-1-2025 388 Handtekening: Wim Breuck	Eigelaar Beyaert Kouterstraat 5 8550 Zwevegem EAN541448860023973873	Verantw. uitvoering 20/02/2025 Handtekening	Ovaere Franky BE0678.253.296 Wulfsbergstraat 13a 8550 Zwevegem	2/2
---	--	--	---	------------



