

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

3 OPMERKINGEN

- 1 Voor meer informatie: ovam.vlaanderen.be/het-bodemattest.
- 2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op ovam.vlaanderen.be/disclaimer.
- 3 Maatregelen opgelegd of van toepassing buiten het kader van het Bodemdecreet worden niet vermeld op het bodemattest. Hiervoor kunt u best contact opnemen met uw lokaal bestuur.
- 4 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

te Mechelen, 19.07.2024



Ann Cuyckens
afdelingshoofd



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

Bovengrondse stookolietank

Besluit: De tank mag niet meer gevuld worden en mag niet meer gebruikt worden

Volgende controle:

Datum keuring: 22/07/2024

Inspecteur: Dieter Goderis

Mentor: -

ID-label:

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel:

Serienummer:

Datum verslag: 22/07/2024

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Klytemolenstraat
Huisnummer 86
Busnummer
Postcode 8940
Gemeente Wervik
Land België

Eigenaar

Naam -
Straatnaam Klytemolenstraat
Huisnummer 86
Busnummer
Postcode 8940
Gemeente Wervik
Land België

Installateur

Naam -
BTW nr. -
Telefoonnummer -
E-mail -

Type

Comformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

RESERVOIR

Plaatsing reservoir Toegankelijk bovengronds
Type reservoir Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg
Inhoud reservoir 2400 L
Datum plaatsing voor 01/08/1995 (bestaand)

Nieuw reservoir

LEIDINGEN

Aansluitingen (ontluchting, vulling)
Staat leidingen (ontluchting, vulling)
Uitmonding leidingen
Staat aanvoerleiding
Staat terugvoerleiding
Stookoliefilter
Lekt stookoliefilter

RESERVOIR

Algemene staat tank
VORIG CERTIFICAAT

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
	☒	☐		
			☒	☐
			☒	☐
			☒	☐
	☐	☒	☒	☐
	☒	☐		
			☒	☐
			☒	☐
	☐	☒	☒	☐

ACCESSOIRES

PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Peillat	☒	☐	☒	☐
Mechanisch	☐	☒	☒	☐
Pneumatisch	☐	☒	☒	☐
Ultrasoon	☐	☒	☒	☐

OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)

Fluit	☐	☒	☒	☐
Elektronische sonde	☒	☐	☒	☐

TESTEN

OK

NOK

Opmerkingen

Dichtheidscontrole: Onderdruk

☐

☒

Drukverlies mbar/h

Potentiaalverschilmeting niet mogelijk

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Nota De identificatieplaat van de tank is niet aanwezig / niet leesbaar

Nota Voorafgaand verslag van periodieke controle ontbreekt


Rood: inkuiping ontbreekt.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n): ☐

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Dieter Goderis (erkeningsnummer SV05541)



Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.

Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.

Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtestreeks, of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.


Kwaliteit


De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorgaan en de aanvrager.

De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

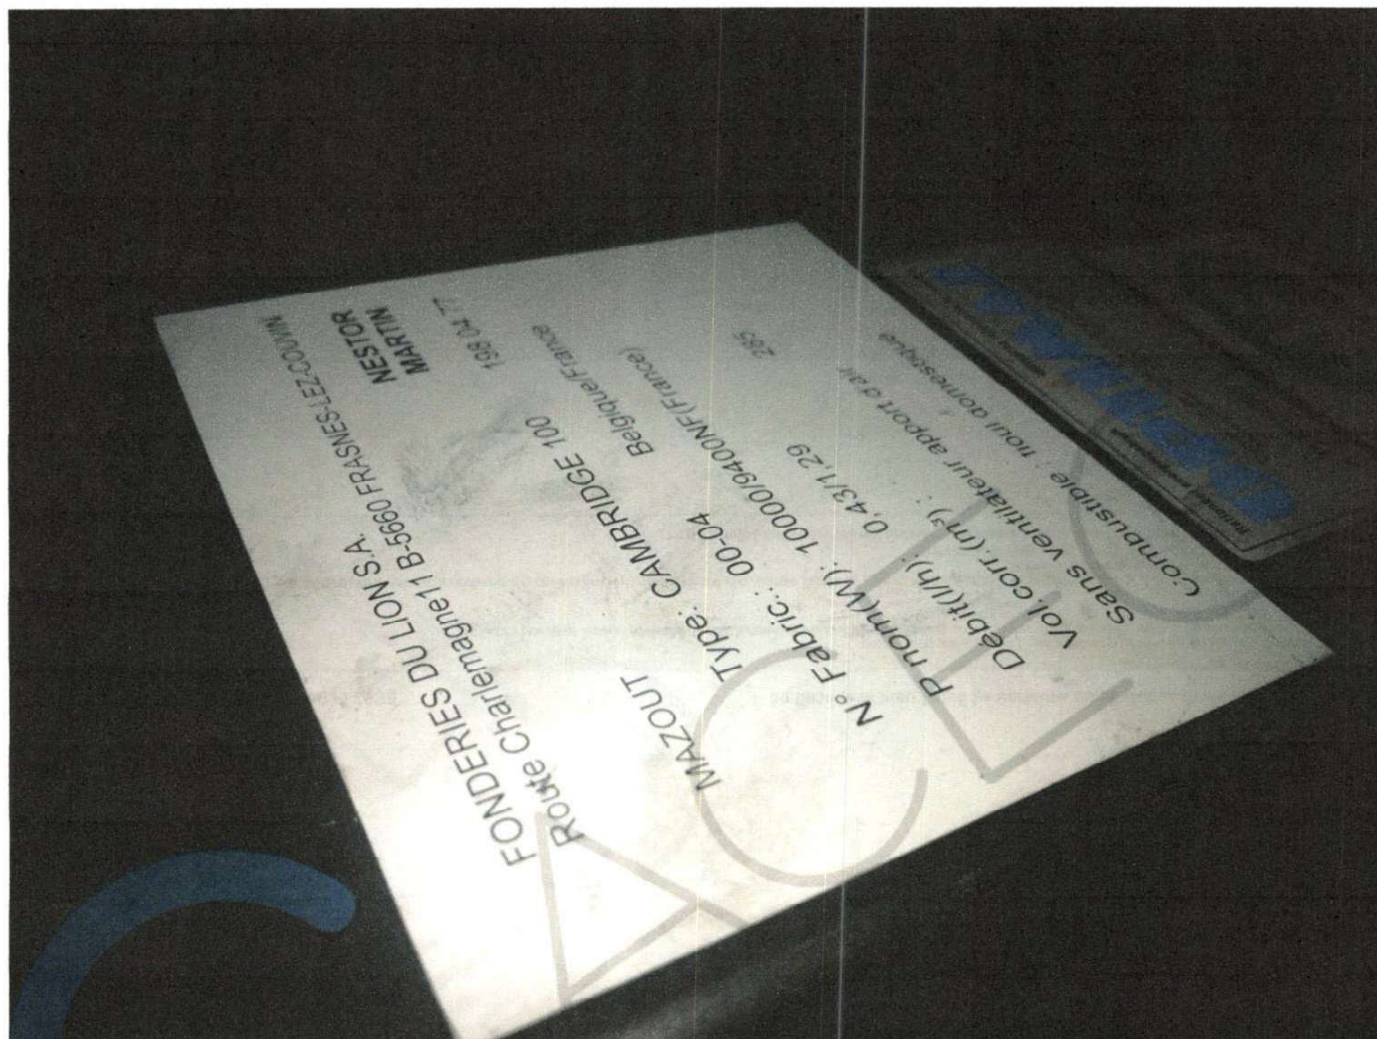

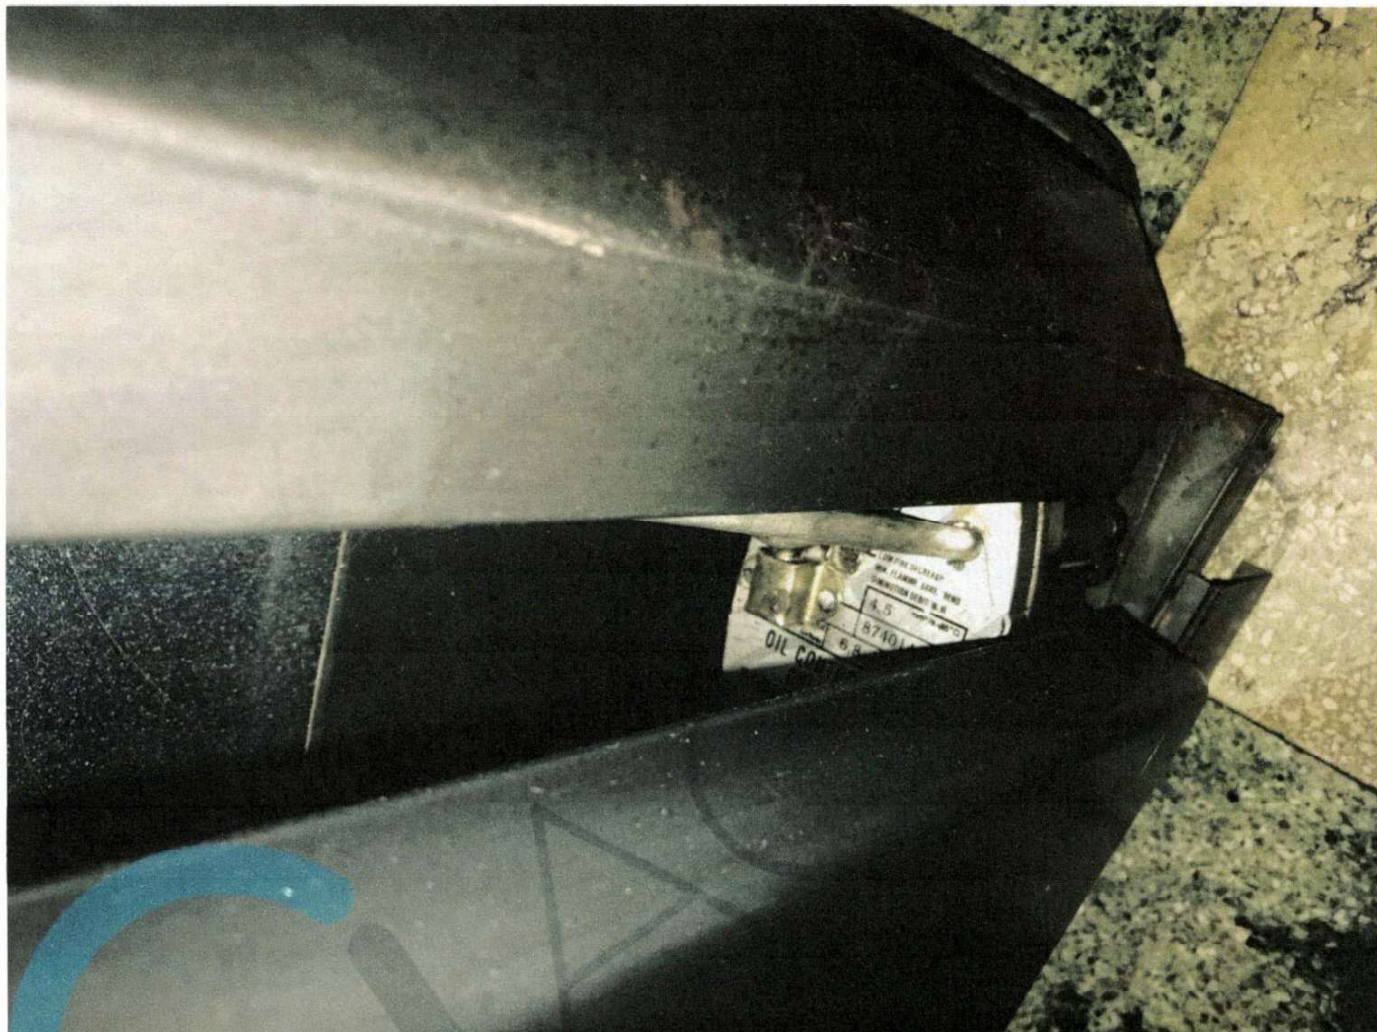














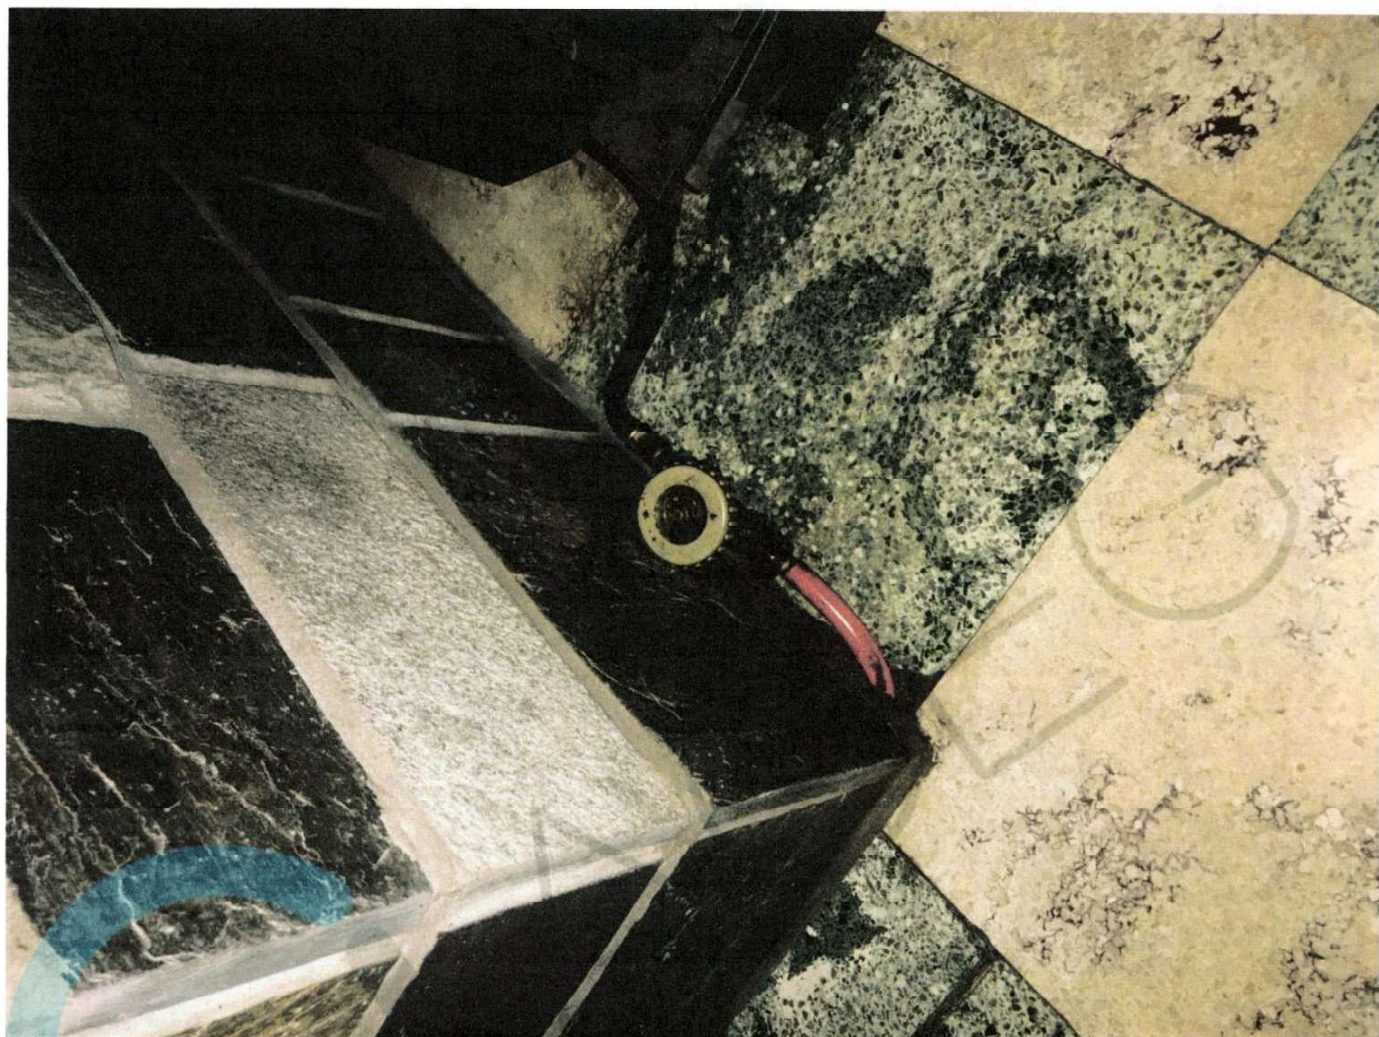



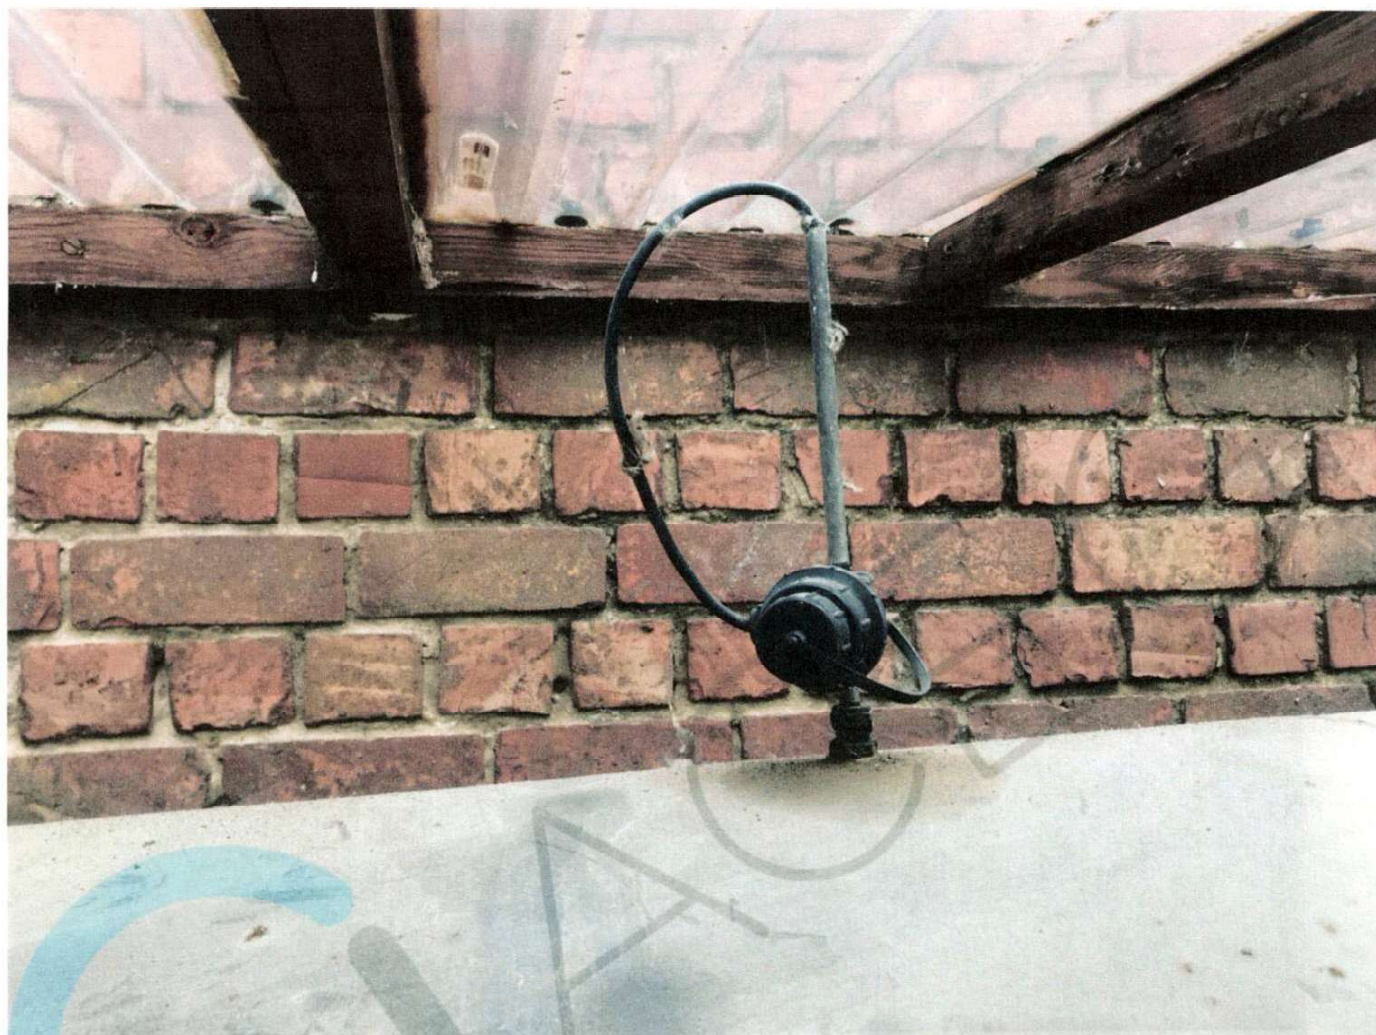



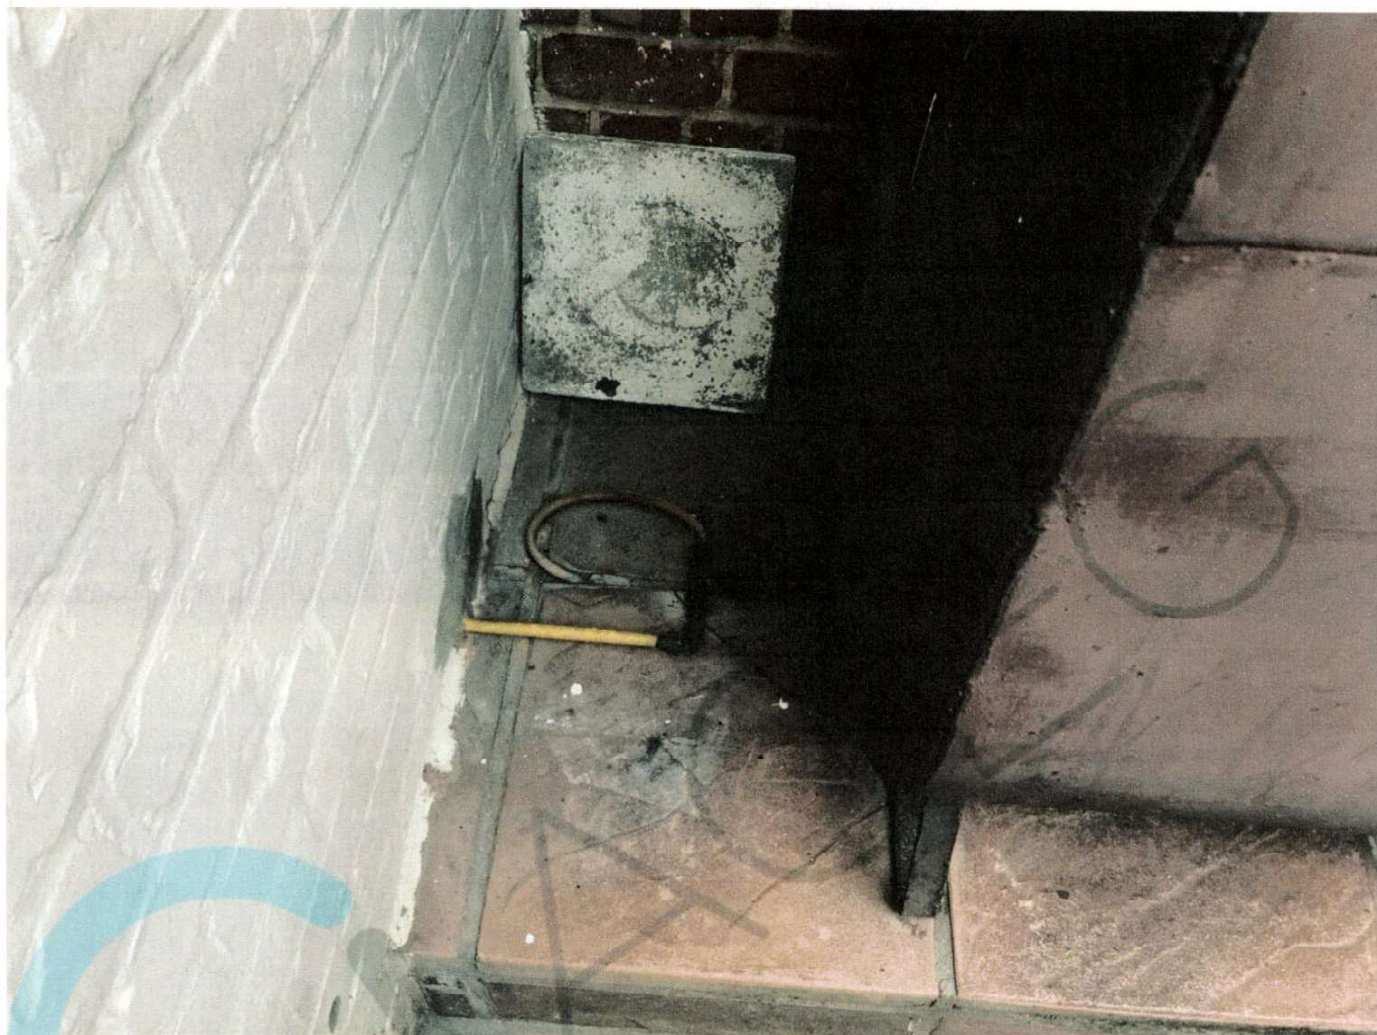





Vlaanderen
verbeelding werkt

Vastgoedinlichtingen voor overdracht

VIP-00276407

33009C0467/02H003

VLAANDEREN
DIGITAAL
