



Verslag

VERSLAG NR

GEN/15/61083236/00/NL/000



040 - INSP

Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1 - KB 8/09/2019) - Algemene Directie Energie

Pladijsstraat 242 - 8540 Deerlijk



Uitgevoerd op: 29/04/2022



Uitgevoerd door: MARTIJN LEROY (5455)

Conform

IDENTIFICATIE VAN DERDEN

Opdrachtgever van de controle

Naam, Voornaam	PERNEEL BVBA
Adres	Stijn Streuvelsstraat 14- 8870 Izegem

Eigenaar, uitbater of beheerder

Naam, Voornaam	PERNEEL BVBA
Adres	Stijn Streuvelsstraat 14- 8870 Izegem

Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk

Niet van toepassing

IDENTIFICATIE VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Vinçotte ID	100 080 761
Adres	Pladijsstraat 242 - 8540 Deerlijk
EAN-code	Niet meegedeeld
Nr Teller	6085167
Teller index dag	9804
Teller index nacht	4459
Type installatie	HUISHOUDELIJKE Inst.

VINÇOTTE vzw

Erkend controleorganisme | Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats (EDTC)
Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België tel: +32 9 244 77 91 buildingnorth@vincotte.be
BTW BE 0402.726.875 RPR Brussel BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB

GEGEVENS VAN DE CONTROLE

De controle wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie (B.S. van 28/10/2019), in dit document "Boek 1" genoemd.

Type controle	- Controlebezoek (6.5.)
Datum van de uitvoering van de installatie	- Voor 01/10/1981
Informatie inhoud controle	- Alleen de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie werden gecontroleerd. - Aan de hand van de ter plaatse verzamelde informatie kunnen we de datum van voltooiing van de elektrische installatie niet met zekerheid vaststellen. - De verlichtingsarmaturen waren niet geïnstalleerd op het moment van onze controle. - De badkamer/doucheruimte was op het moment van onze controle nog niet geïnstalleerd/voltoid. - De foto's ter illustratie van inbreuken en opmerkingen worden als voorbeeld gegeven en zijn niet limitatief; de inbreuken en opmerkingen kunnen elders in de installatie worden herhaald.
Afwijkingen	- Toepassing van deel 8

GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Spanning (V)	230
Aard van de stroom	Driefasig
Type van aardelektrode	Aardinspen(nen)
Voedingsleiding - Type	VFVB
Voedingsleiding - Doorsnede (mm ²)	10
Aantal eindstroombanen	17
Type van het aardverbindingssysteem	TT
Nominale waarde van de bescherming van de aansluiting (A)	60
Geplaatste (alg.) differentieelstroominrichtingen	2

Differentieel	In(A)	Gevoeligheid (mA)	Type
Hoofddifferentieel	40	300	A

Beschrijving van de elektrische installatie


HB

Plaats

Berging keuken

Aantal stroombanen

13

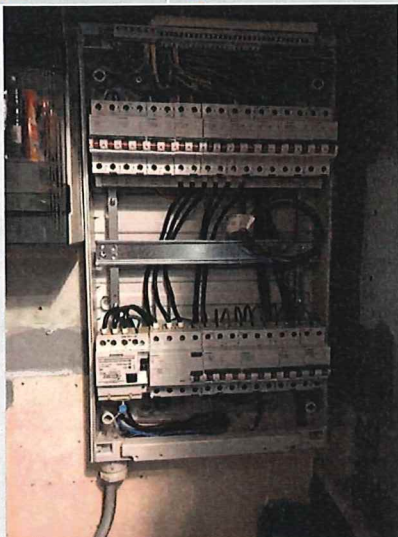

(Inwendige foto)



(Uitwendige foto)


Sb.1

Plaats

Tuinhuis

Aantal stroombanen

4

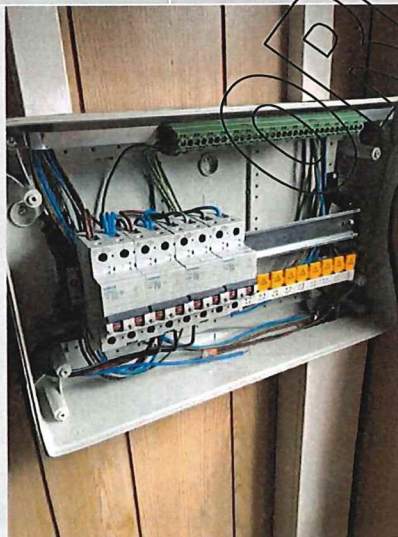

(Inwendige foto)



(Uitwendige foto)

SCHEMA'S EN PLANNEN VAN DE INSTALLATIE

Eendraadsschema - versie	1
Eendraadsschema - datum	19/04/2022
Eendraadsschema	Zie bijlagen
Situatieplan - referentie	Pernelec
Situatieplan - versie	1
Situatieplan - datum	19/04/2022
Situatieplan	Zie bijlagen

RESULTATEN VAN DE CONTROLE

Uitgevoerde controles

Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de eendraadsschema's en de situatieplannen	In orde
Staat van het vast geïnstalleerd elektrische materieel	Ok
Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking	Ok
Visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen	In orde
Visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen	N.V.T.

Metingen en beproevingen

Spreidingsweerstand van de aardverbinding(en) (Ω)	10.69
Waarde van het algemeen isolatieniveau (MQ)	1.116
Test werking van de differentieelstroominrichtingen (testknop)	Ok
Test werking van de differentieelstroominrichtingen (foutlus)	Ok
Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders	Ok

Vastgestelde inbreuken

- Nihil

Opmerkingen

- Nihil


BESLUIT VAN DE CONTROLE

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Boek 1 (KB van 8/09/2019) inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

Het volgend controlebezoek moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór 29/4/2047.

De eendraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden opnieuw gedateerd en ondertekend.

De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie werd verzegeld.


Ing. J. Windey
Directeur-generaal Vincotte

VERWIJZING NAAR DE REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.

De Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft moet onmiddellijk in kennis worden gesteld van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties.

Bijlagen

Foto situatieplan (1/2)

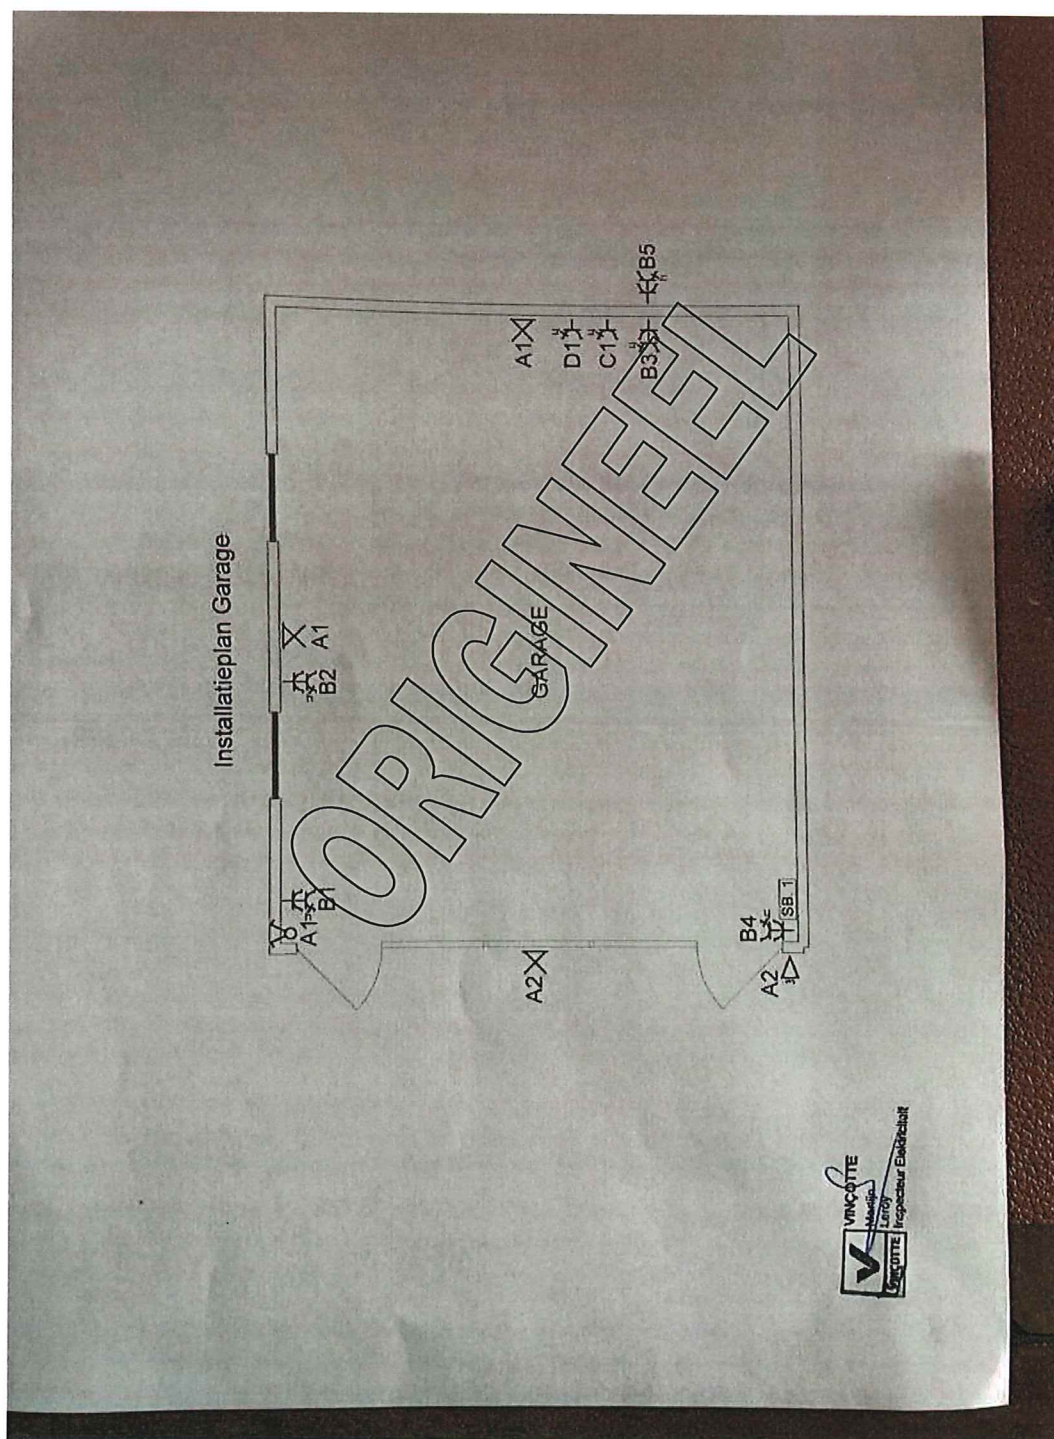


Foto situatieplan (2 / 2)

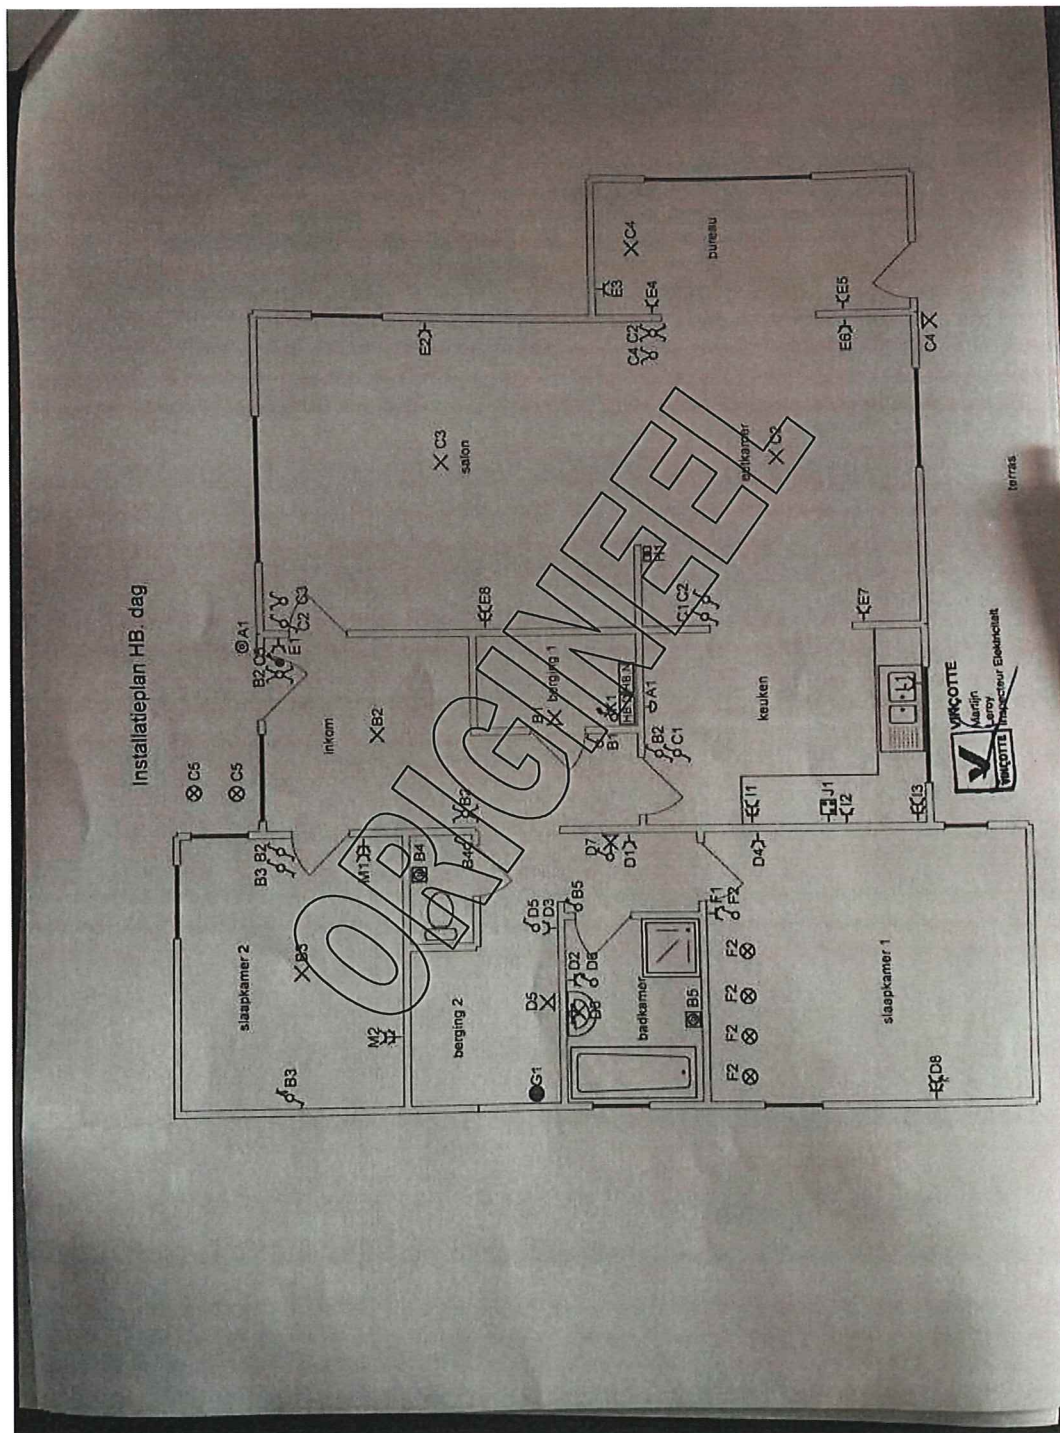
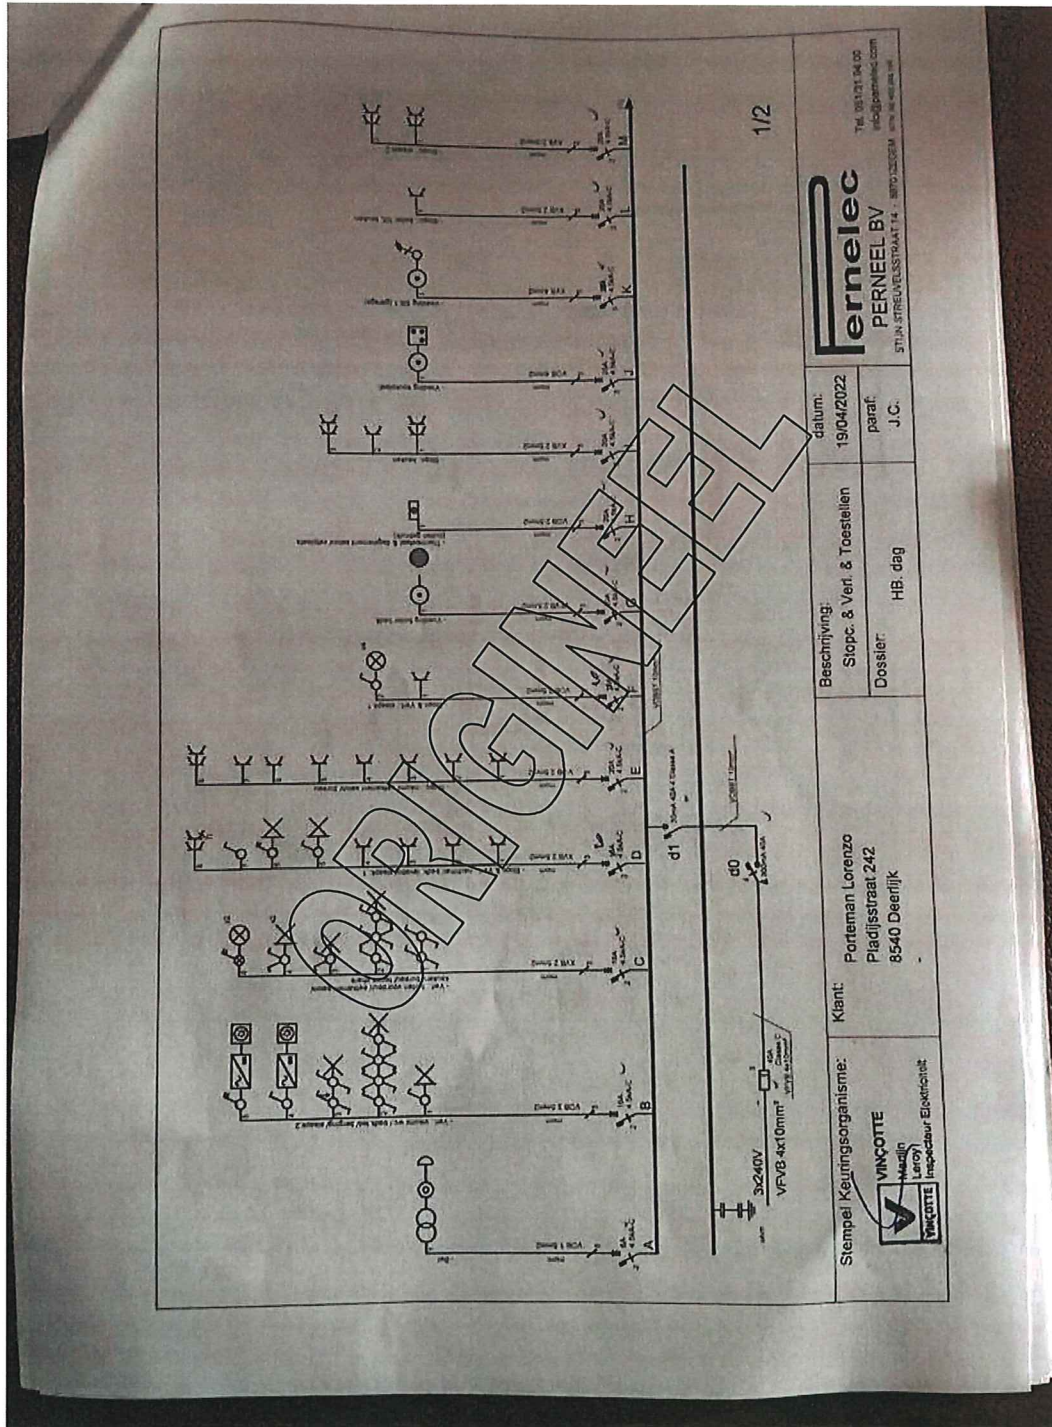


Foto van de eendraadschema's (1/3)



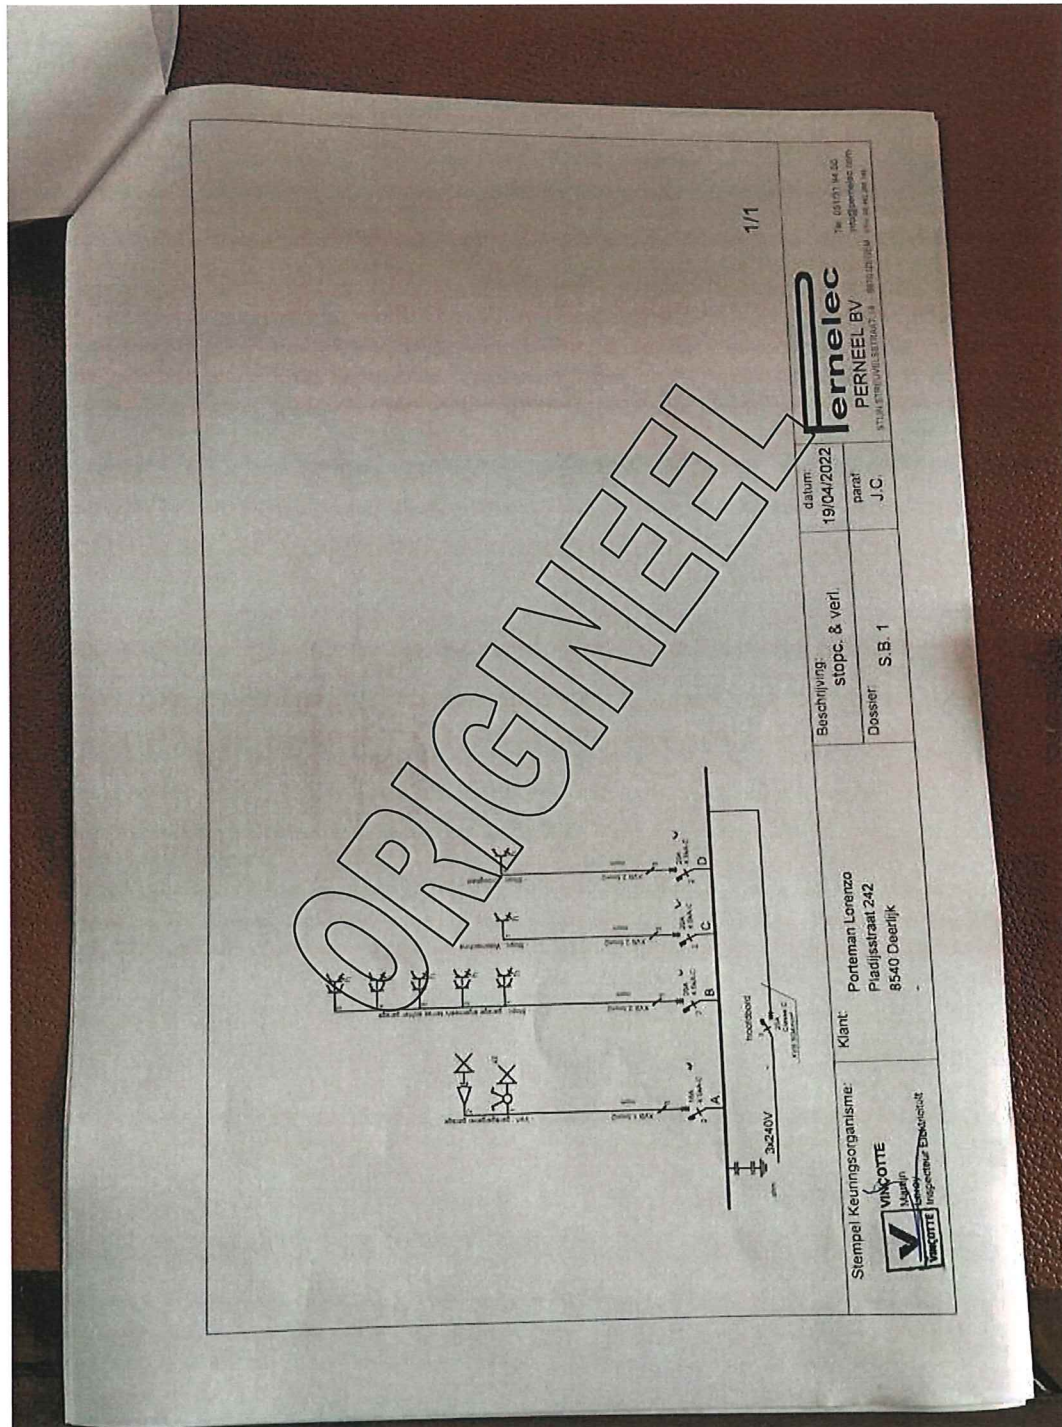


Foto van de eendraadschema's (3 / 3)



PERNEEL BV
Stijn Streuvelsstraat 14
8870 Izegem Tel: 051/31.94.00
www.pernelec.com
info@pernelec.com



Erkende Meester Elektricien



Datum: 19-04-2022

Klant: Porteman Lorenzo

Dossier: Pladijsstraat 242
8540 Deerlijk

Thema: Elektr. installatie

Bord: Hoofdbord dag & nacht / SB.1

In deze map	Beschrijving	Blad:	Plan nr.
X	Lijnomschr.HB.dag	1	
X	Eendr.sch.HB.dag	2	
X	Inst.pl.gelijkv.	3	
X	Lijnomschr.HB.nacht	4	
X	Inst.pl.gelijkv.	5	
X	Eendr.sch.HB.nacht	6	
X	Lijnomschr.SB.1	7	
X	Inst.pl.SB.1	8	
X	Eendr.sch.SB.1	9	
X	Keuring door AV.:		



VINÇOTTE
Martijn
Leroy
Inspecteur Elektroloot

